



Frontansicht der Überdachung (Masse in cm)

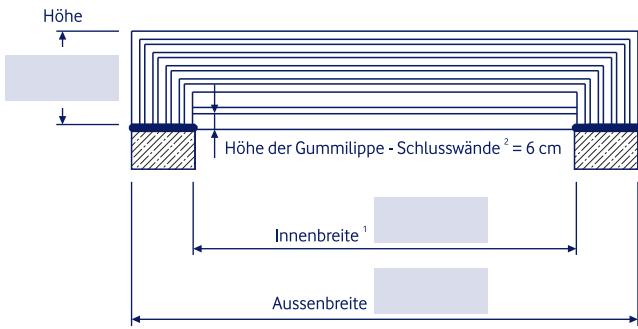

- | | |
|------------------------------|---|
| Farbe der Alu-Konstruktion | <input type="checkbox"/> Silber elox |
| | <input type="checkbox"/> Anthrazit RAL 7016 - pulverbeschichtet |
| Verglasung | <input type="checkbox"/> Polycarbonat 4mm transparent |
| | <input type="checkbox"/> Polycarbonat 4mm getönt |
| | <input type="checkbox"/> Polycarbonat 4mm silber |
| | <input type="checkbox"/> Polycarbonat 6mm transparent |
| Elektro-Antrieb ³ | <input type="checkbox"/> |

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Mitnehmer ⁴ | <input type="checkbox"/> rechts |
| | <input type="checkbox"/> links |
| Farbe der Laufschiene | <input type="checkbox"/> Silber elox |
| Anzahl der Laufschiene | <input type="checkbox"/> 1-seitig |
| | <input type="checkbox"/> 2-seitig |
| Überdachung ⁵ Versperbar | <input type="checkbox"/> ja |
| | <input type="checkbox"/> nein |
| Eingelassene Schienen ⁷ | <input type="checkbox"/> ja |
| | <input type="checkbox"/> nein |

Grundriss der Überdachung (Masse in cm)



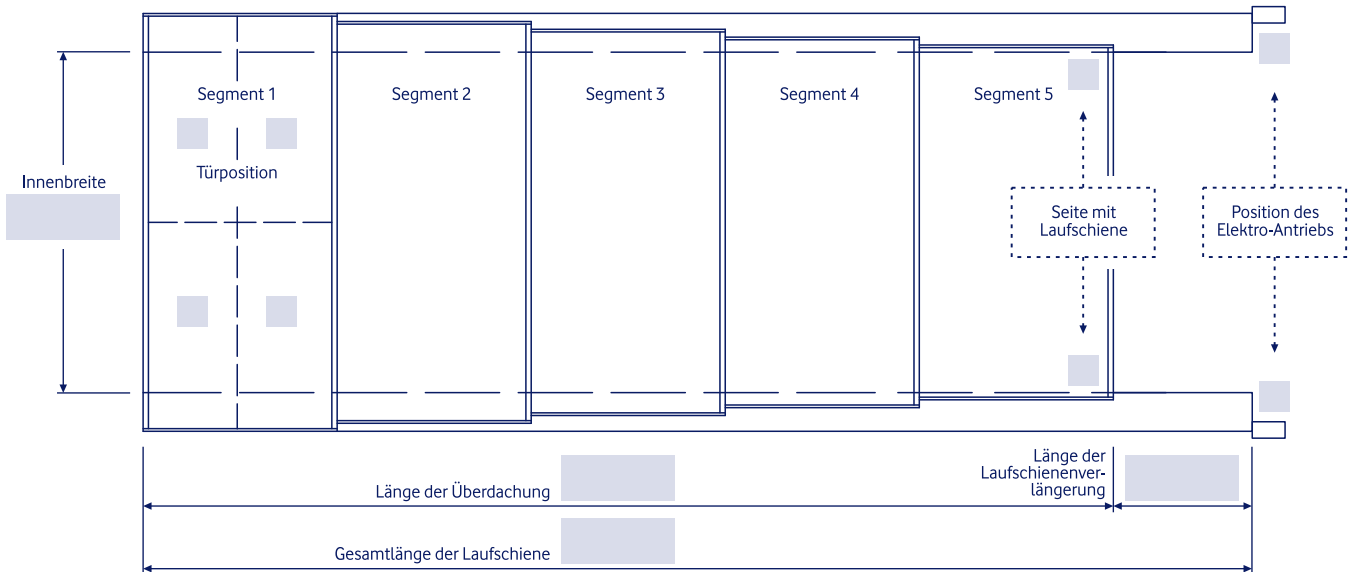


Einstiegsvarianten / Lüftungsklappen



Datum und Unterschrift Empfänger:

Datum und Unterschrift Lieferant:

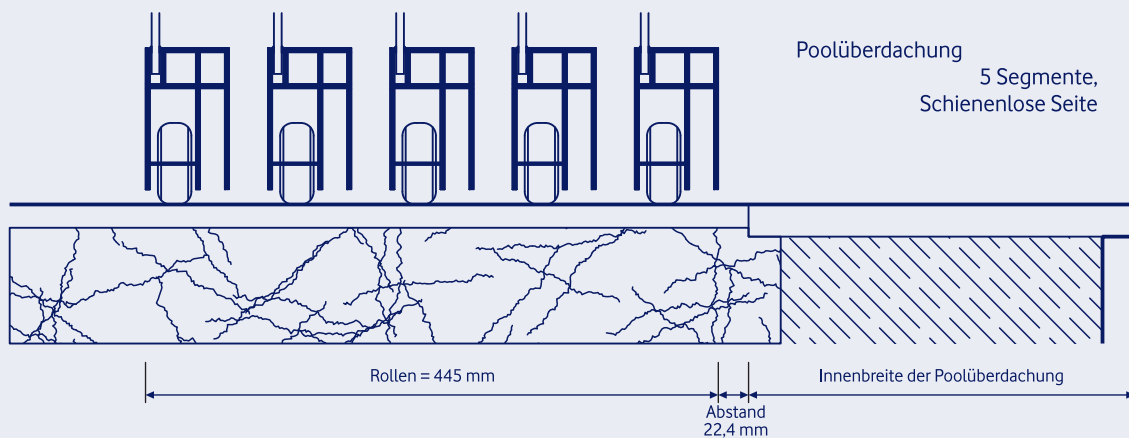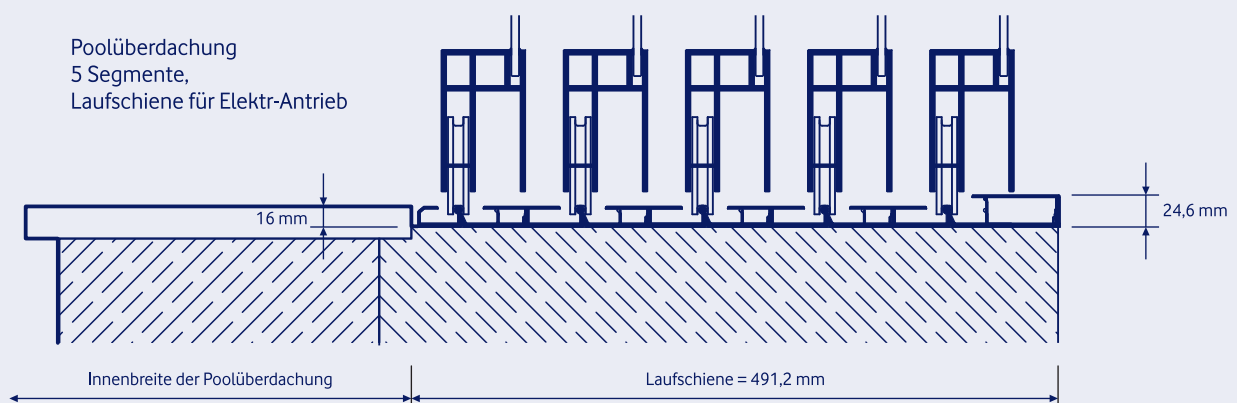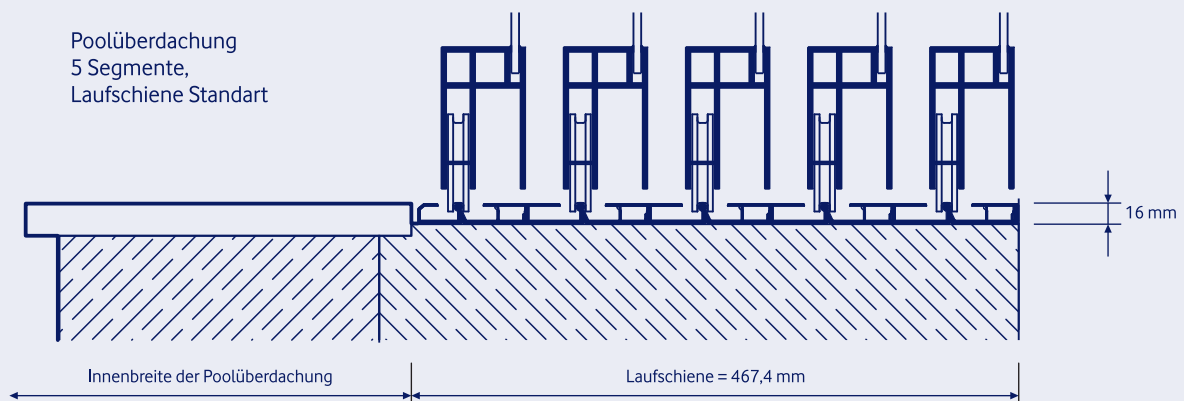

Notizen

- 1/ Innenbreite – auch bei der Überdachung mit der 1-seitigen Schiene versteht man dieses Mass als Innenbreite zwischen den „beiden“ Schienen (siehe Bild oben)
- 2/ Lichte Höhe der Gummilippe ist um 1 cm kleiner als die Gesamthöhe.
- 3/ Elektro - Antrieb - bitte Position angeben.
- 4/ Mitnehmer – bitte die Seite angeben, an welcher die Mitnehmer positioniert sind - von vorne gesehen (vom grössten Segment). Falls die Überdachung mit Mitnehmer ausgestattet ist, sind die Arretierungen nur beim grossen und kleinen Segment montiert. Bei der 1-seitigen Ausführung sind die Mitnehmer immer auf der Seite mit Schiene positioniert.
- 5/ Die Versperrbarkeit der Überdachung ist wie folgt ausgeführt: das erste und letzte Segment sind durch Arretierung – montiert in das Fundament – fixiert, die mittleren Segmente sind durch versperrbare Mitnehmer fixiert. (2 verschiedene Schlüssel).
- 6/ Seitenschiebetür ist positioniert immer am grössten Segment. Breite der Seitenschiebetür ist $\frac{1}{2}$ der Gesamtlänge des Segments. Position der Seitenschiebetür bitte angeben.
- 7/ Falls bei einer Einschiene-Poolabdeckung die Schiene eingelassen wird, muss dies vor der Fertigung berücksichtigt und angegeben werden.
